

Габариты и принятые решения

Основание: исходный PDF, листы 1–3; уточнения заказчика. Стены и покрытие без проёмов.

ПЛАН · ОБОЗНАЧЕНИЕ СТЕН

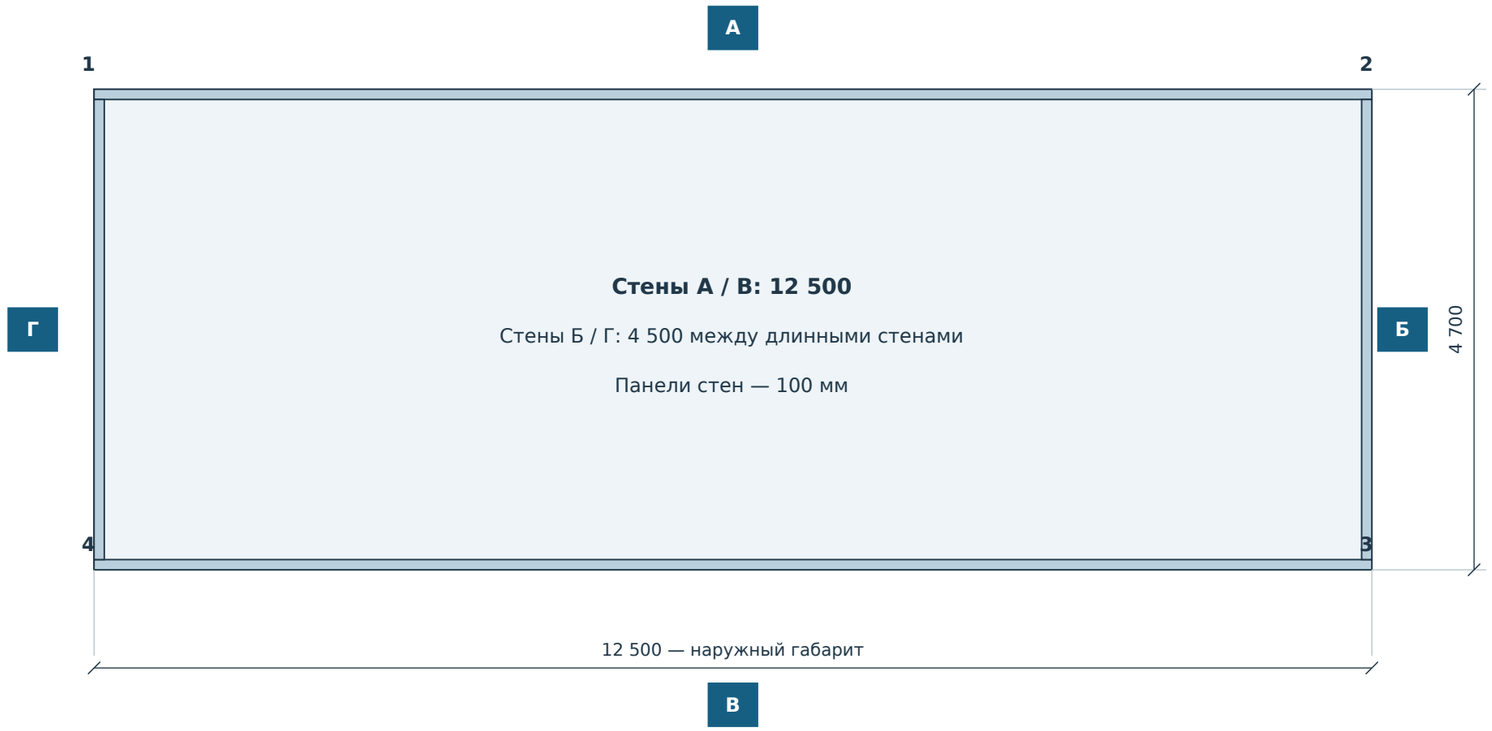

ВЫСОТНАЯ ЦЕПЬ

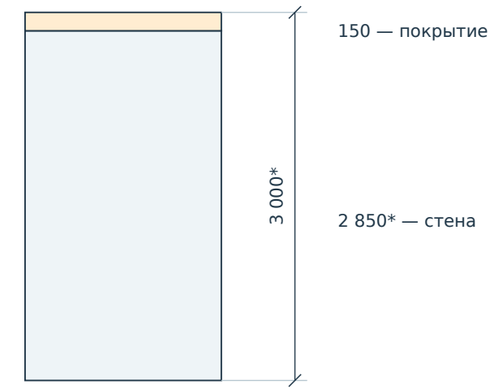

* Номинально: 2 850 + 150 = 3 000. Гидроизоляция и монтажные зазоры входят в общий габарит 3 000 мм: высоту стен уточнить подрезкой после выбора фактического узла.


1. Наружный габарит относится к панелям; выступы фасонных деталей согласовать в узлах.
2. Стены: вертикальный монтаж; рабочая ширина 1 000 мм; минеральная вата, толщина 100 мм.
3. Покрытие: плоские панели 150 мм, рабочая ширина 1 000 мм, без уклона; отдельная сплошная гидроизоляция.
4. Применение панелей покрытия горизонтально, опоры, крепёж и нагрузки подтверждает производитель / конструктор.
5. Толщина покрытия 150 мм — предварительная; теплотехнический расчёт для Новосибирска не выполнен.
6. Проёмы по указанию заказчика исключены из раскладки. Их площадь из закупки не вычитается.
7. Все размеры в мм. Указана рабочая ширина; полную ширину с замком подтверждает поставщик.

Длинные стены A и B

Ряды по 13 элементов. Каждая марка соответствует отдельной закупаемой заготовке 1 000 × 2 850 × 100.

СТЕНА A · ВИД СНАРУЖИ


угол 2 → угол 1

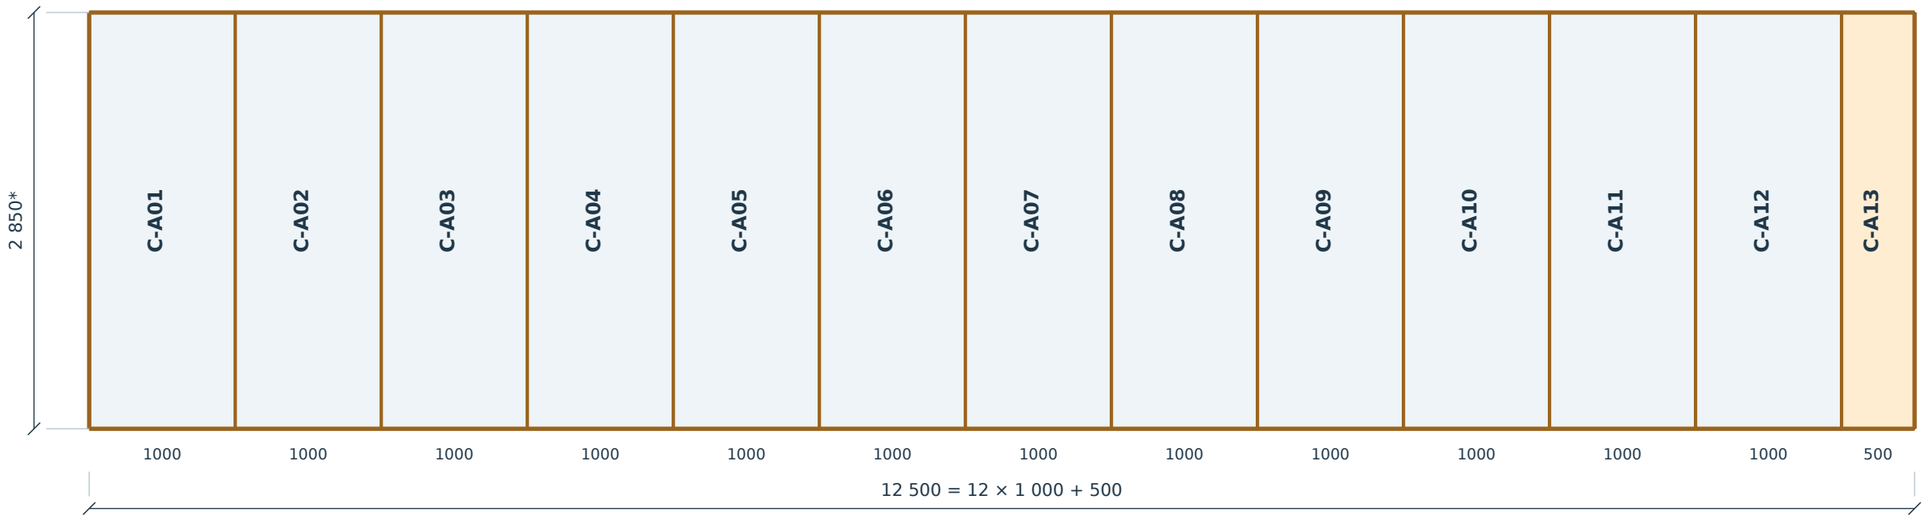

* До уточнения узла покрытия; чистовая подрезка только после проверки каркаса.

СТЕНА B · ВИД СНАРУЖИ

угол 4 → угол 3

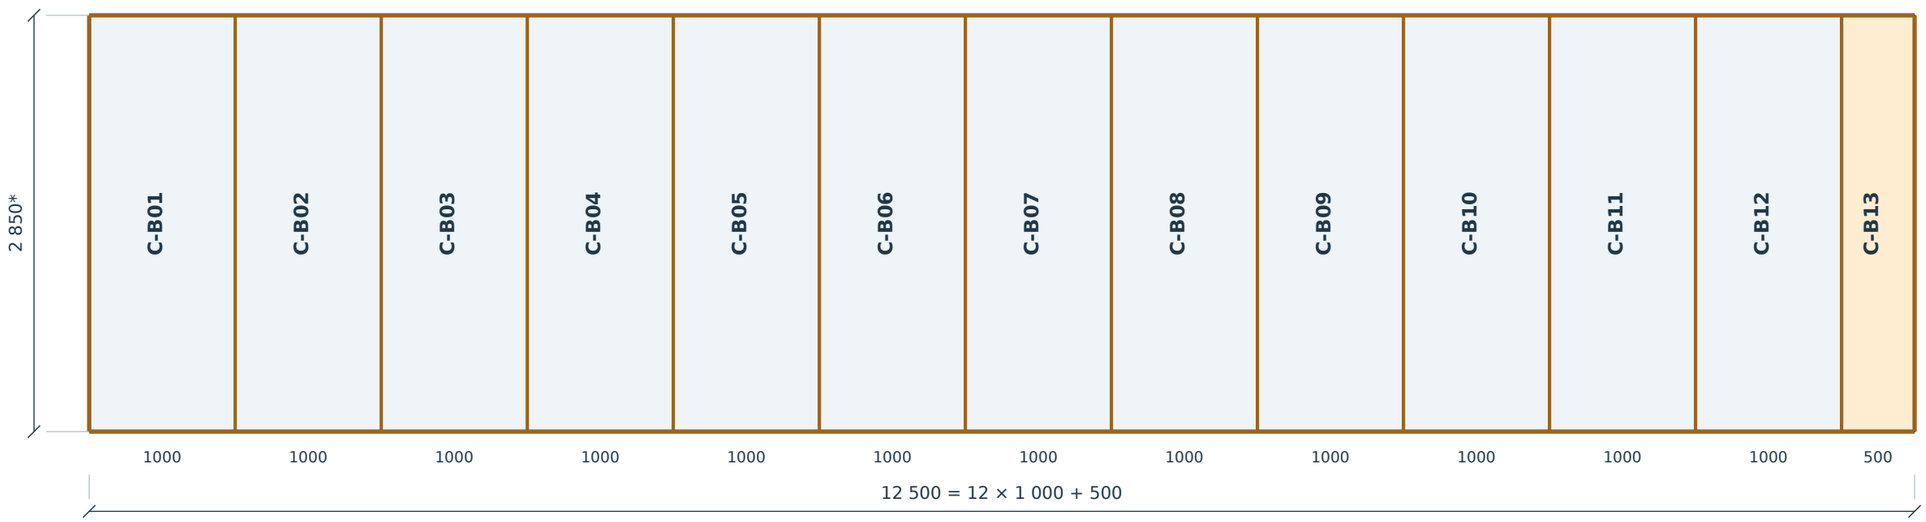


* До уточнения узла покрытия; чистовая подрезка только после проверки каркаса.

Торцевые стены Б и Г

Панели торцов устанавливаются между длинными стенами: 4 700 − 2 × 100 = 4 500.

СТЕНА Б · ВИД СНАРУЖИ


угол 3 → угол 2

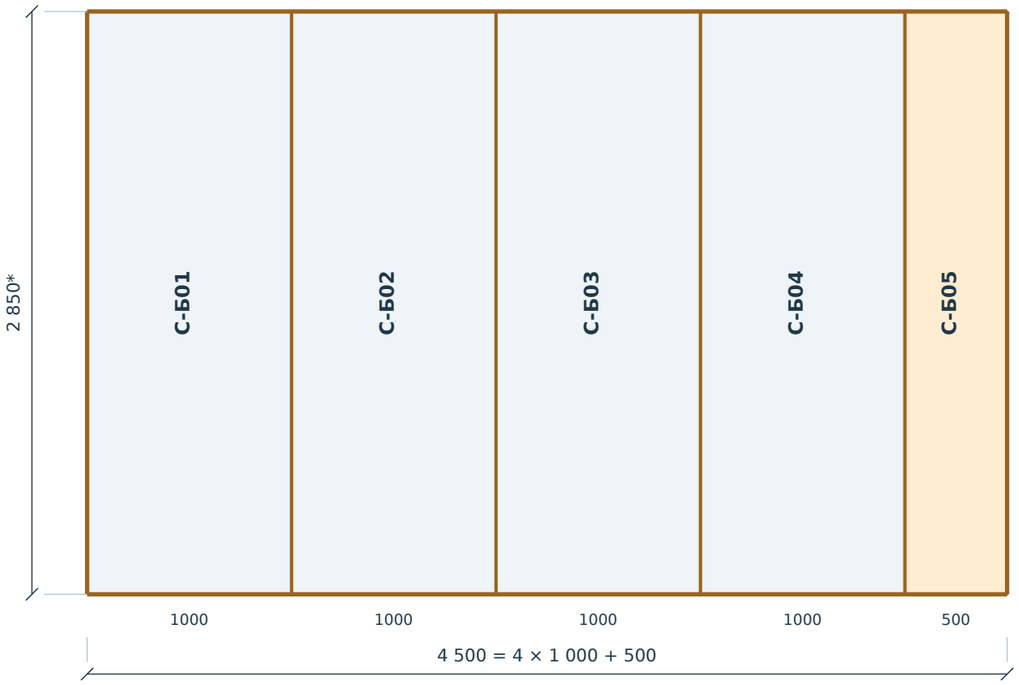

* До уточнения узла покрытия; чистовая подрезка только после проверки каркаса.

СТЕНА Г · ВИД СНАРУЖИ

угол 1 → угол 4

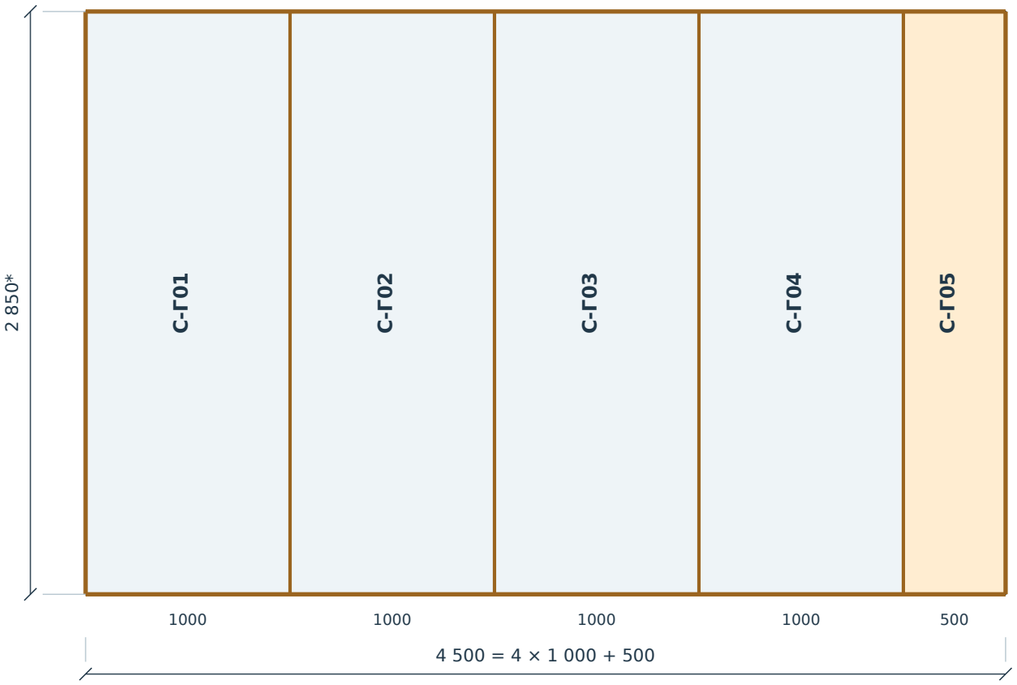

* До уточнения узла покрытия; чистовая подрезка только после проверки каркаса.

УГЛЫ И ПОДРЕЗКИ

Длинные стены закрывают торцы коротких. Углы закрываются фасонными элементами по узлу поставщика.


Оранжевым показаны доборные элементы шириной 500 мм; каждый вырезается из отдельной полной панели.

Продольный рез выполняется со стороны угла с сохранением замка со стороны соседней панели.

Размеры 12 500 и 4 500 — номинальные цепочки; монтажные зазоры учесть в крайних подрезках.

Плоское покрытие · план раскладки

13 панелей длиной 4 700 мм; уклон 0% по заданию заказчика. Свесы за наружный габарит не предусмотрены.

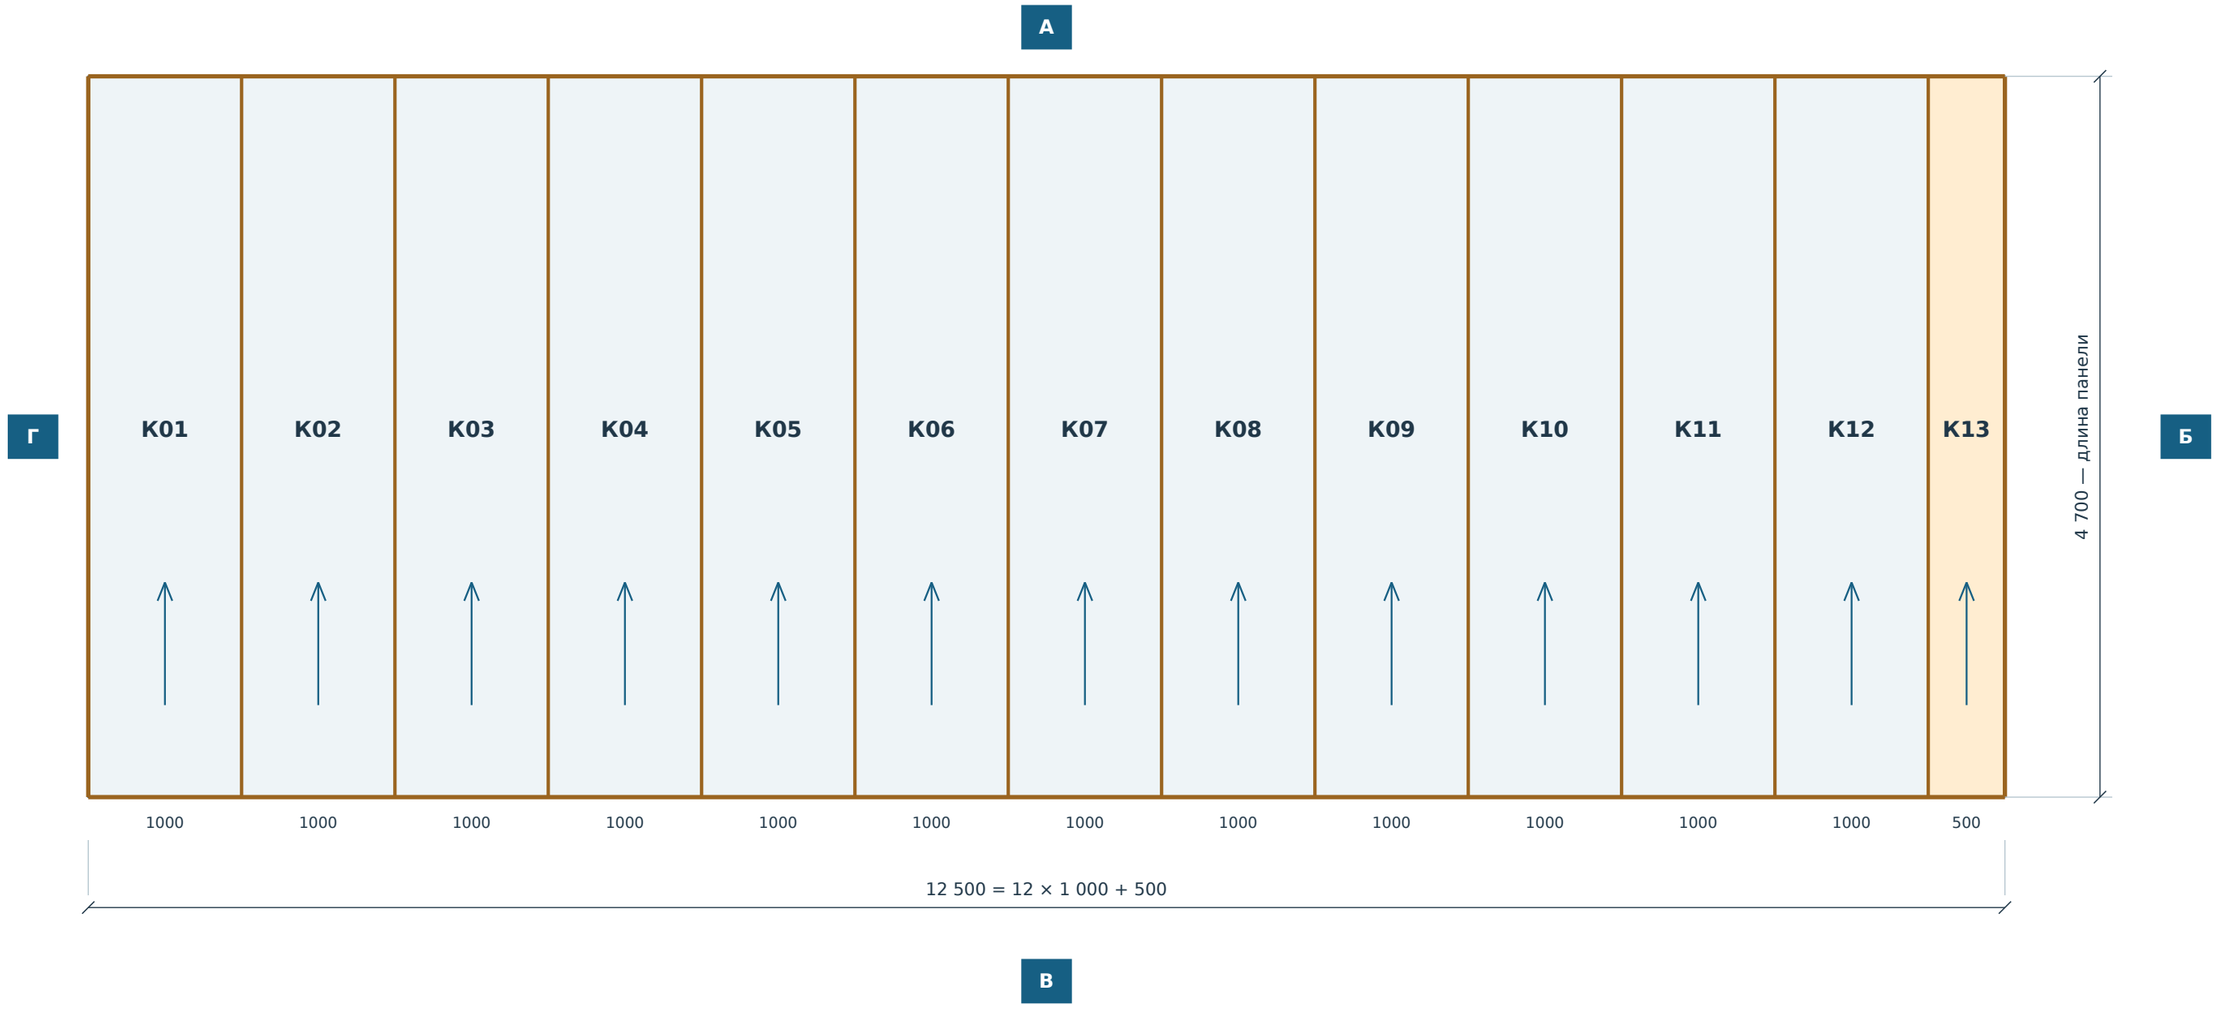

Стрелки показывают направление длины панелей, а не расчётный пролёт. Шаг опор здесь не назначен.

K13: заготовка 1 000 × 4 700; подрезать по ширине до 500 со стороны края покрытия, сохраняя рабочий замок.

Над панелями — сплошная гидроизоляция по совместимому основанию. Замки панелей гидроизоляцию не заменяют.

Безуклонное покрытие: отдельно решить водоотвод, герметизацию периметра и проверить прогиб / скопление воды.

Ведомость закупки и раскроя

Размер заготовки: рабочая ширина × длина × толщина. Числа ниже — без коммерческого запаса.

Позиция	Сердечник / мм	Заготовка, мм	Шт.	Площадь², м²
Стеновые панели	МВ · 100	1 000 × 2 850 × 100	36	102,60
Панели плоского покрытия[1]	МВ · 150	1 000 × 4 700 × 150	13	61,10
ИТОГО — основной комплект	—	—	49	163,70

РАСКРОЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Марки / расположение	Размер после раскроя[3]	Шт.	Примечание
А / В: С-А01…12; С-В01…12	1 000 × 2 850	24	Без продольной подрезки
А / В: С-А13; С-В13	500 × 2 850	2	Из 2 отдельных полных панелей
Б / Г: С-Б01…04; С-Г01…04	1 000 × 2 850	8	Без продольной подрезки
Б / Г: С-Б05; С-Г05	500 × 2 850	2	Из 2 отдельных полных панелей
К01…К12	1 000 × 4 700	12	Без продольной подрезки
К13	500 × 4 700	1	Из 1 отдельной полной панели

Площадь элементов после раскроя: стены 96,90 м²; покрытие 58,75 м²; всего 155,65 м².

Разница с закупкой — 8,05 м² (4,9%): продольные обрезки; возможная чистовая подрезка по высоте не учтена.

Рекомендуемый запас отдельно: 1 стеновая + 1 панель покрытия. С запасом: 51 шт., 171,25 м².

[1] Нужна модель, допускающая горизонтальный монтаж и расчётные нагрузки. Обычную стеновую панель не подменять.

[2] Площадь по рабочей ширине; коммерческий способ расчёта площади согласовать с поставщиком.

[3] Высоту стен 2 850 уточнить по фактическому верхнему узлу. Уменьшение допускается чистовой подрезкой.

Два элемента по 500 из одной панели 1 000 не заложены: мешают пропил, геометрия кромок и ориентация замков.

Наличие в Новосибирске и сроки не подтверждены. Рабочая ширина 1 000 выбрана как распространённый формат.

Поштучная маркировка

Нумерация на фасадах — слева направо при взгляде снаружи. Ориентация каждого фасада указана на листах 2–3.

Марка	Заготовка	После раскроя*	t
С-А01	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А02	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А03	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А04	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А05	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А06	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А07	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А08	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А09	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А10	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А11	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А12	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-А13	1000 × 2850	500 × 2850	100
С-Б01	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-Б02	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-Б03	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-Б04	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-Б05	1000 × 2850	500 × 2850	100
С-В01	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В02	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В03	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В04	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В05	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В06	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В07	1000 × 2850	1000 × 2850	100

Марка	Заготовка	После раскроя*	t
С-В08	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В09	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В10	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В11	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В12	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-В13	1000 × 2850	500 × 2850	100
С-Г01	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-Г02	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-Г03	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-Г04	1000 × 2850	1000 × 2850	100
С-Г05	1000 × 2850	500 × 2850	100
К01	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К02	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К03	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К04	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К05	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К06	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К07	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К08	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К09	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К10	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К11	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К12	1000 × 4700	1000 × 4700	150
К13	1000 × 4700	500 × 4700	150

* Все размеры в мм. Для стен указана номинальная высота до уточнения верхнего узла.

До заказа: подтвердить тип и замок панелей, сертификат стен EI 120 по исходному PDF, толщину покрытия, расчёт опор и крепежа, монтажные зазоры, узел гидроизоляции и допустимость будущих вырезов.

Нащельники и доборные элементы

Наружная сторона. Охристые линии на листах 2–4 обозначают закрываемые стыки; ширина показана условно.

Марка	Назначение	Подсчёт, м	Чистая длина, м	Ориентир закупки[1], м
H1	Вертикальные стыки стен	32 × 2,85	91,20	101
H2	Наружные углы	4 × 2,85	11,40	13
H3	Нижний периметр / цоколь	2 × (12,5 + 4,7)	34,40	38
H4	Верхний периметр / край покрытия	2 × (12,5 + 4,7)	34,40	38
H5	Продольные стыки покрытия	12 × 4,7	56,40	63

H4 — один комплект по верхнему периметру, закрывающий узел стены и края кровли.

Второй отдельный периметр кровли не добавлен: иначе возник бы двойной подсчёт одного узла.

Профиль H4 может быть составным. Число деталей определяется после разработки сечения.

[1] Ориентир = чистая длина + 10%, с округлением вверх до целого метра. Это не карта раскроя доборов.

Нахлёсты, длины поставки и ширины развёрток уточнить при заказе; 10% может не покрыть отходы коротких деталей.

Профили: H1 — стыковая планка; H2 — наружный угол; H3 — цокольная планка; H4 — верхнее примыкание;

H5 — защитная накладка стыка покрытия, согласованная с принятой гидроизоляционной системой.

Сталь с полимерным покрытием, предварительно 0,5 мм; цвет согласовать. Размеры полок не назначены:

они зависят от каркаса, зазоров, профиля панелей, гидроизоляции и схемы крепления.

Нащельники закрывают щели. Утепление стыков, уплотнительные ленты и герметизацию выполнить по системе панелей.

H5 не заменяет гидроизоляцию. Сплошная гидроизоляция: 58,75 м² в плане, без нахлёстов и заводов на примыкания.

Крепёж доборов и панелей назначается по каркасу и расчётным нагрузкам; в эту ведомость не включён.
